

2025 육군 IT 혁신 컨퍼런스

육군 정보화 사업의 추진방향과 C4I 발전방안을 공유하고, 최신 IT 트렌드 교류를 통해
『첨단과학기술 기반의 정예 육군』을 구현하기 위한 컨퍼런스

2025. 11. 11. (화) ~ 11. 12. (수) | 대전컨벤션센터 제1전시장



지능정보기술단



'25년 정보화사업 성과분석 및

'26년 사업추진 방향

지능 정보 기술 단



CONTENTS

- 01 육군 지능정보기술단 정보화사업 수행
- 02 '25년 정보화사업 추진 현황
- 03 '25년 정보화사업 주요 시사점
- 04 '26년 정보화사업 추진 개요
- 05 질 의 및 응 답
- 06 사업별 성과분석 / 업체발표회

육군 지능정보기술단 정보화사업 수행

공정하고 투명한 사업 집행

- 매년 업체 사업설명회 개최, 청렴 알리미 운영, 하도급 지킴이 제도 시행
- 제도적 장치를 통한 신뢰성 확보와 민원 최소화
- 공정성 · 투명성 · 효율성을 기반으로 한 사업 추진

육군 정보화사업의 중심 기관

- 연간 약 1,000억 원 규모의 정보화 예산 집행 / 관리
- 지휘통제체계 · 전력지원체계 등 육군 핵심 정보체계 사업 주도

미래 지향적인 정보화사업 발전

- 첨단 ICT 기술을 활용한 육군 전력 현대화 지원
- 육군의 발전을 선도하는 최상위 정보화사업 전문 기관으로 도약

육군 정보화 통제사업 기관별 임무분장

소요제기 부대(서)	육군본부 (정보화기획참모부)	집행기관 (지능정보기술단)	재무부대(서) (국군재정관리단)
• 소요보고 • 사업 일상감사 • 보안대책 검토 • 보급계획 확인 및 검수 • 보안축정(보안부서)	• 소요종합 / 검토 • 사업추진 방향 결정 • 소요심의(계획, 결과) • 집행계획 수립 등 • 제안요청서(사양서) 심의 • 기술협상 • 사업통제 • 보급계획 작성 / 하달	• 제안요청서(사양서) 작성/보고 • 계약의뢰 • 제안서 평가 • 평가결과 보고 • 사업감독 • 검수계획 / 결과 확인	• 제안요청서(사양서) 인터넷 공개 • 입찰 공고 • 적격 심사 • 제안서 접수 • 개찰 / 가격협상 • 낙찰자 결정 / 계약 • 대금지급

육군 정보화사업 프로세스




정보화사업 프로세스 및 부서별 임무 등

진행절차	담당부서	세부내용
사업계획서 작성	정보화부	· 사업예산, 부대별 세부 소요 등 종합 / 작성 · 장비별 세부 규격서 작성 / 검토
제안요청서 등 작성 / 심의(1차)	지능정보기술단	· 세부 요구사항, 규격 / 계약특수조건 등 작성 및 심의 · 법무실 법무 검토
중양계약 의뢰	지능정보기술단	· 재정관리단으로 계약 의뢰 및 인터넷 사전 규격 공개
사전규격 공개 의견 검토	지능정보기술단	· 사전규격 공개 후 업체별 의견 종합 / 검토 · 1차 검토(지능단), 최종 검토(정보화부)
제안요청서(사양서) 보완	지능정보기술단	· 사전규격 공개 의견 반영 후 제안요청서 보완
제안요청서(사양서) 심의(2차)	정보화부	· 보완된 제안요청서 최종 검토 / 심의
중양계약 수정 의뢰	지능정보기술단	· 재정관리단으로 최종 계약 의뢰
원가산정 검토	재정관리단	· 중양계약 의뢰 후 원가산정에 대한 적절성 등 검토
입찰공고	재정관리단	· 국방전자조달시스템, 조달청 나라장터 활용 공고
제안서 평가	지능정보기술단	· 지능단 제안서 평가위원회의 구성 / 심의(외부인력 포함)
가격평가 및 개찰	재정관리단	· 최저가 순으로 가격 평가 · 기술능력평가 점수와 합산하여 개찰
기술협상	정보화부	· 제안요청서 등의 요구사항을 기초로 기술협상 진행
낙찰자 결정 및 계약체결	재정관리단	· 우선협상대상자 협상 성립 후 낙찰자 결정 및 계약체결

* 민원대응: 진행절차별 담당부서

'25년 정보화사업 추진 현황

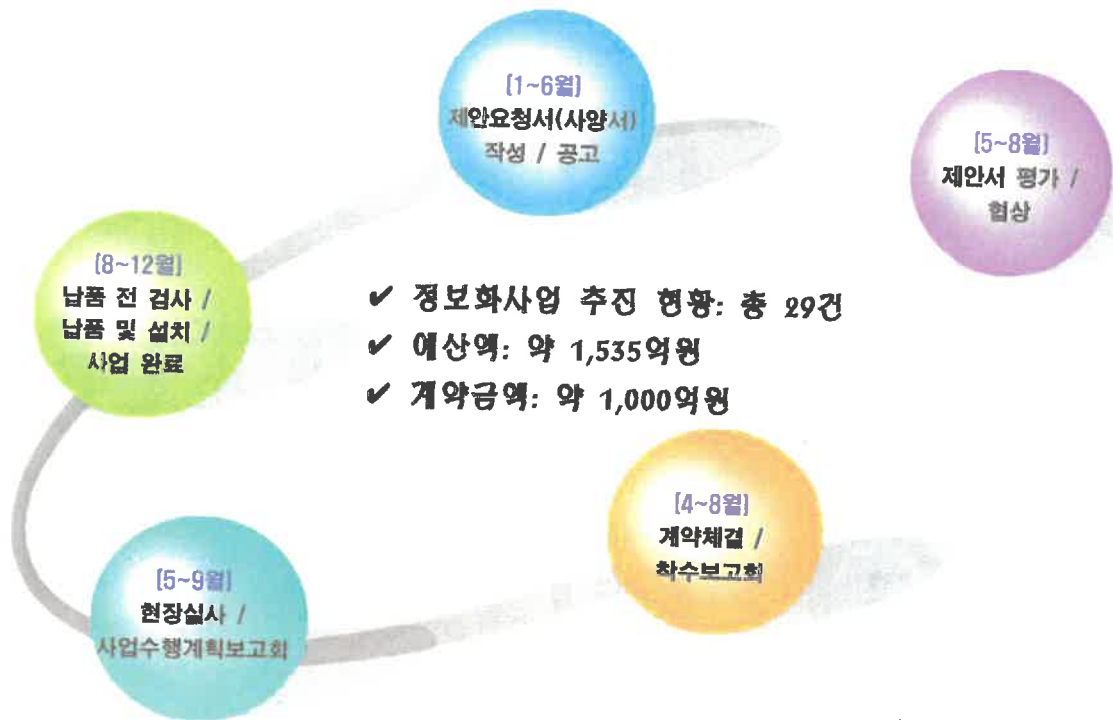

'25년 정보화사업 현황

사업명	예산액	계약액	계약	RFP작성/공고	평가/협상	계약체결	납품/설치	사업완료
'25~'27년 상용정보통신장비 통합유지보수 사업	275억원	236억원	협상	1~8월	8.5. ~ 19.	8.26.	9.1. ~	'27.8.31.
LAN 교체 사업	212억원	190억원	2단계	1~6월	7.2.	7.28.	10~11월	'25.12.15.
VoIP 교체 사업	103억원	47억원	2단계	1~6월	6.27.	7.3.	9~11월	'25.12.20.
PC 도입 사업	368억원		2단계	1~6월	7.9	진행 중		
모니터 도입 사업	13억원	10억원	적격	1~6월	6.23.	7.9.	8~11월	'25.11.5.
프린터 도입 사업	40억원	24억원	적격	1~6월	7.4.	7.21.	8~11월	'25.12.15.
노트북 도입 사업	110억원	96.8억원	협상	1~6월	8.7.~ 22.	8.29.	9~11월	'25.12.29.
전시체계 구축 사업	39억원	30억원	적격	1~4월	4.30.	4.16.	9~11월	'25.11.11.
화상회의 장비 교체 사업	19억원	15.6억원	협상	1~7월	9.9.~ 24.	9.25.	10~12월	'25.12.19.
AMOS 유지보수 사업	3억원	2억원	협상	1~4월	5.20. ~ 30.	6.5.	6월~	'25.12.31.
행정업무지원체계 유지보수 사업	8억원	8억원	협상	1~4월	5.22. ~ 5.24	5.26.	6월~	'25.12.31.
VoIP 교환기 유지보수 사업	19억원	17억원	적격	1~6월	7.22.	7.16., 8.14.	8월~	'26.6.30.

* 수의계약 제외 : AMOS SW라이선스 구매(VPN,Knox), 고속상광전파체계 유지보수, ATCIS 유지보수, 군 스마트폰 활용체계, 재난망 단말기 라이선스(통신, 앱), 재난망 위치정보 ATCIS 연동체계 구축

주요 사업 낙찰자 결정방법 등 계약형태 개선

☞ [배경] 최저가 경쟁으로 확보할 수 없는 '기술력, 전문성, 수행능력, 재무상태 등'이 우수한 업체와 계약을 체결하기 위함.

주요 사업명	'24년	'25년
① LAN 교체 사업(본 사업)	2단계 경쟁(규격·가격 동시)	2단계 경쟁(규격·가격 동시)
①-1 LAN 교체 사업(서지보호기, UPS)	적격심사제	적격심사제
② VoIP 교환기 교체 사업(본 사업)	2단계 경쟁(규격·가격 동시)	2단계 경쟁(규격·가격 동시)
②-1 VoIP 교환기 교체 사업(음성동보)	적격심사제	적격심사제
② PC 도입 사업	2단계 경쟁(규격·가격 동시)	2단계 경쟁(규격·가격 분리)
③ 노트북 도입 사업	적격심사제	협상에 의한 계약
④ 모니터 / 프린터 도입 사업	적격심사제	적격심사제
⑤ 전시체계 구축 사업	적격심사제	적격심사제
⑥ 화상회의 장비 교체 사업	적격심사제	협상에 의한 계약
⑦ 상용정보통신장비 통합유지보수 사업	(조달청) 협상에 의한 계약	(조달청) 협상에 의한 계약 (자동점수제 적용)

기술력 · 전문성이 우수한 낙찰자 결정을 위한 방법[기술(90):가격(10)] 확대

'24~'25년 정보화사업 낙찰자 결정방법 비교 분석

총괄 현황

구분	총계	수의계약	적격심사제	2단계 경쟁	협상에 의한 계약
'24년	28건	10건	11건	3건	4건
'25년	29건	10건	9건(-2건)	3건	7건(+3건)



낙찰률 비교

구분	적격심사제		2단계 경쟁		협상에 의한 계약	
	건수	낙찰률	건수	낙찰률	건수	낙찰률
'24년	11건	85.2%	3건	75.2%	4건	91.2%
'25년	9건	77.3%	3건	67.3%	7건	91.5%

제안요청서 작성 / 심의절차 보완

【배경】 최신규격 반영과 육군의 요구사항이 반영된 제안요청서 작성을 위한 절차 보강

- (제안요청서의 법적 효력) 계약문서와 동일한 법적 효력이 있음.
 - 과년도 과오사례, 요구규격 최신화 반영 여부 등 심의 후 사전규격 공개토록 절차 보완이 필요하였음.
 - 인터넷 사전규격 의견을 종합 검토 후 수정된 내용으로 정보화부에서 최종 심의를 진행함.
- ⇒ (절차 보완) 지능정보기술단 내부 심의체를 운용, 심의 후 인터넷 사전규격 공개

【보완 요소】 입찰공고 전까지 검토 및 심의를 고려시 4~6주 추가 소요됨에 따라 절차 간소화가 필요함.

【보완 사항】 사전규격 의견 검토결과가 반영된 후 단 심의 진행

- (긍정적 요소) 소요기간이 2~3주 단축이 가능하고, 불필요한 행정적 낭비 제거 가능함.
 - (부정적 요소) 육군재정과 국국재정관리단의 계약절차 등 개정이 필요함.
- ⇒ (추진 방향) '26년부터 단순구매 물품 구매사업에 적용 후 규정 개정 등 추진

사업기간 확보를 위한 절차 개선 추진

정보화사업 제안요청서(사양서) 심의절차 개선

❁ '25년 개선내용

구 분	기존 절차	개선 절차	기대 효과
지능정보 기술단	• 별도 심의 없이 작성결과만 지휘관 대면 보고 • 온나라 결제 후 정보화부 발송	• 작성 후 심의위원회에 의한 심의 • 심의 후 지휘관 보고	• 과년도 오류사항 재발 방지 가능 • 요구규격 최신화 반영상태 등 확인 가능
정보화부	• 대령급 과장을 위원장으로 위원회 구성 • 심의 후 정보화부장 보고	“좌 동”	• 인터넷 사전공개 후 수정사항 반영 확인 가능 • 민원 등 업체와 갈등요소 최소화 가능

❁ 보완이 필요한 사항

- 단 심의와 사전공개 의견 검토 기간을 고려시 최대 4~6주 소요

구 분	내부 심의 후 인터넷 사전공개 전까지 소요	사전규격 공개 후 업체 의견 검토 / 정보화부 심의 등 소요
소요기간	2~3주	2~3주

※ 제안요청서 등 작성 후 지휘관 대면보고 → 인터넷 사전규격 공개 → 업체 의견 검토
→ 단 심의 → 정보화부 최종 심의 순으로 변경 검토

'25년 주요 이슈사항 Ⅰ

적격심사제 축소 및 협상에 의한 계약 확대로 제안서 평가 중요성 확대

- 적격심사제 평가요소 vs 제안서 평가요소

적격심사제 평가요소	제안서 평가요소
· 물품 납품이행 능력(납품실적, 기술능력, 경영상태) · 입찰가격 · 신인도(품질정도, 계약이행성실도, 신뢰정도) · 결격사유(물품 납품이행 결격여부)	· 체계규격 및 성능 · 사업수행능력(수행실적, 재무구조, 사업이해도 등, 수행조직, 관리방법 등)

⇒ 적격심사는 과거 실적과 기술능력 등 위주의 평가이지만, 제안서 평가는 사업의 전반적인 능력을 종합적으로 평가가 진행됨.

- 제안사의 필수 증빙서류 누락과 불명확한 증빙자료로 제출로 불합격 처리
 - * 공인기관의 담당자에게 직접 확인, 불명확한 자료에 대해 공식의견을 확인하여 불합격 처리
- 인증서 대체가 가능한 공인기관 답변서에 대한 제안사의 부정행(잘못된 질문에 대한 답변서) 행위* 불합격
 - * 인증서 제출 제한 시 공인기관의 공식 답변서로 대체가 가능하나, 대체된 증빙서류에 잘못된 질문으로 제안사의 장비가 문제가 없음을 증빙하여 평가간 불합격한 사유 발생

⇒ 협상에 의한 계약 확대로 제안요청서(사양서)에 명시된 증빙서류 검증 등 강화 필요

인증서 등 증빙서류 검증 및 PM 면접 강화

- 제안요청서에 명시된 공인기관의 인증서 등 증빙서류 검증 강화 및 공인기관 추가 확인 절차 반영
- 사업관리자(PM) 자질과 역할 등을 검증하기 위한 면접 강화

사업이해도(PM 면접), 제품 증빙서류 검증이 평가 중요요소로 정착

평가지 인증서 등 증빙서류 필수제출 표준안 (예시)

사업대상	방송통신기기 기자재 등의 적합등록 필증 (인증서)	전기안전 인증	전기안전 확인	보안기능 확인서	보안 서약서	제조사 정품확인서	제조사 공급 (기술지원) 확인서	제조사 체계규격 충족 확인서	적합성 시험성 적서 (시험 신청서)	환경표지 인증서	품질 인증서
LAN	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
서지	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-
UPS	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-
Voip 교환기	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
화상회의	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
전시체계	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
PC	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
노트북	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-
프린터	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
모니터	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-

'25년 주요 이슈사항 [2]

미래 네트워크 환경 개선을 위한 SDN 기능 필수항목으로 변경 / BMT 진행

- SDN 적용한 미래 네트워크 환경 개념도



- 체계규격 만족평가(BMT): 총 42개 항목 중 SDN 기능지원(Open Flow, Netconf, API) 추가 시행
 - * 대상장비: 백본스위치, 광 스위치, 엣지 스위치, 이더넷 스위치
 - * 결과: 5개 제조사 참가 / 합격(2개 제조사), 포기(3개 제조사)

네트워크 관리가 용이, 향후 타 체계까지 SDN을 확대하여 적용 가능

SDN 시험항목 및 평가 지표

구분	항목	시험방법 및 절차	평가 방법	평가기준
필수	1. SDN 네트워크 구성에서의 SPINE-LEAF 구조 적용 확인	① SPINE-LEAF 구조를 SDN 스위치 연결 ② 연결구성된 모든 스위치의 정상적인 설비 등록상태 확인 ③ VxLAN 생성, 삭제, 수정 확인	· 컨트롤러 접속 후 해당 SPINE-LEAF 스위치의 등록, 관리기능 확인 · VxLAN 생성, 삭제, 수정시 LEAF간 자동 업데이트를 위한 동적 VLAN이 구성되었는지 확인	· 네트워크(A,B,C)간 통신여부 · 계층기의 트래픽 통신 정상 확인 여부 판단
	2. SDN 네트워크 구성에서의 VxLAN 구조 적용 확인	① LEAF에 수용된 A B C 네트워크의 계층기 포트를 다른 LEAF로 이동 구성 ② 이동 후 네트워크별 계층기에서 트래픽 통신 확인	· 네트워크별 계층기에서 트래픽 통신 확인	· 각 LEAF 스위치에 계층기 포트를 이동 연결시 별도 설정없이 트래픽 통신 정상 확인 여부 판단 · IP/MAC 정보를 LEAF 스위치간 자동 업데이트를 위한 동적 VLAN이 구성되었는지 확인
	3. SDN 스위치의 최소 설정을 통해 컨트롤러와 연동된 장비의 인벤토리(Inventory) 관리, 토폴로지 구성 기능 구현	① 최소설정(IP 및 인증정보) 된 신규 SDN 스위치 연결 ② 연결 후 컨트롤러의 자동등록, 제어 확인 ③ 연결 후 장비의 하드웨어 정보 및 네트워크 구조 육안확인	· 컨트롤러 접속후 해당 SPINE, LEAF 스위치의 등록 관리 기능 확인 · SDN 컨트롤러의 대시보드를 통해 토폴로지 확인	· SDN 스위치 연동 후 컨트롤러에 GUI에 해당 SPINE, LEAF 등록 여부

'25년 주요 이슈 사항 [3]

☛ 데스크톱(PC) 'PKID 스티커' 부착 / 제출 의무화

- (윈도우 복제품 납품 사례) 정품 라벨 구매 후 일부 제품을 정품으로 납품하지 않고, 복제품으로 납품한 사례가 발생
- (인공매체 보도) '군, PC 부실 검수... 2년간 부정납품 감감' / 정품 윈도우 Pro 미설치로 193억원 낭비
 - * 윈도우 Enter버전 사용 시 윈도우 Pro 버전을 동시에 구매 설치해야 하나, COA 라벨 제품의 경우 윈도우 Enter를 설치시 윈도우 Pro가 정품인지 확인이 불가함.

⇒ 육군은 PKID 스티커를 반드시 부착토록 제안요청서에 반영하였음.

[참 고] 윈도우 11 인증방식

구 분	구매방법	정품인증 및 Pro키 확인 방법	비 고
OEM* 제조사	DPK** 방식	· 인터넷 연결시 자동 정품인증 · VMIC 명령어로 Pro키 값 확인	
OEM 미제조사	COA*** 방식	· Pro 제품키를 입력 후 인터넷 연결시 정품인증 · COA 라벨지로 Pro키 값 확인	

* OEM(Original Equipment Manufacturer): 주문자 상표 부착 방식은 Window 운영체제가 포함된 시스템을 판매하는 방식

** DPK(Digital Product Key): PC 메인보드에 Window Pro키 값을 주입, PC 제조사와 MS사 간 직접 계약을 통해 제품을 구매하는 방식

*** COA(Certificates of Authenticity): PC본체에 MS 정품 라벨지(COA)를 부착, PC제조사와 MS 파트너사를 통해 제품을 구매하는 방식

위조 방조 / 자동 인증이 가능한 PKID 방식 지속 추진

PKID vs COA 라벨

항 목	DOEM [PKID : Product Key ID / DPK]	COEM [COA 라벨]
정 의	Microsoft가 DPK에 대해 생성한 고유 식별자, BIOS에 삽입되어 Microsoft 시스템에서 관리됨.	COEM 방식의 DSP 제품에 부착되는 물리적 스티커의 고유번호, 제품키와 함께 인쇄됨.
용 도	디지털 인증, 시스템에 의한 생산 이력 관리, 반품 등 사후관리 자동화 [정품인증, 불법복제 방지, 규제준수 검증 등] * 국방부는 Windows Enterprise를 사용하며, Enterprise 사용을 위해 MS 정책상 반드시 Windows professional을 동시에 구매해야 함.	제품 설치 시 정품 여부를 물리적(육안)으로 증명, 제품키 수동 입력을 통해 인증 진행 * 최근에도 정품 라벨 구매 후 〇〇청, 〇〇〇〇단체에 납품할 일부수량에 대해 정품을 납품하지 않고 복제품을 납품한 사례 발생 (MS사 확인)
정품인증방식	BIOS에 삽입된 DPK를 통해 Windows 설치 시 자동 인증	COA 스티커에 인쇄된 제품 키를 수동으로 입력하여 인증
PC와 1:1매핑	매핑 가능, BIOS에 삽입된 DPK와 연결되어 특정 PC에 고유하게 바인딩 됨	매핑 불가능, 시스템적으로 PC와 연결되지 않음.
추적방식	시스템에서 Fulfillment, Activation, Re-Fulfillment, 반품 이력 등을 추적가능	COA 번호 자체로는 Microsoft 시스템에서 추적 불가, 물리적 스티커로만 관리됨
보안요소	디지털 서명 및 시스템 기반인증으로 위조 방지	홀로그램, 특수잉크 등 물리적 위조 방지 기능 포함 * 꾸준한 위변조 및 불법복제 사례 발생 중으로 수시 디자인 변경
사용대상	DOEM 방식의 DPK 제품(대량, 자동인증 방식)	COEM 방식의 DSP 제품(소량, 수동인증 방식)

'25년 주요 이슈사항 4

공정한 평가와 투명한 절차를 통해 우수한 업체를 정당하게 선정하는 시스템 시행

- 제안서 평가위원회는 내·외부 평가위원 구분, 자격을 갖춘 인원 대상으로 사업 규모에 따라 3배수로 추천, 승인권자(지능정보기술단장) 최종 선정(8~9명)
 - * 평가위원 구성: 내부위원(지능정보기술단 50%), 외부위원(내부위원 외 국방 소속(25%), 공공·학계·연구계 소속(25%))
 - * 위원 자격 : 6년 이상 정보화 분야 업무수행 및 국가기술자격법에 따른 기술사·박사학위(정보화 분야) 소지 등
 - ※ 세부내용은 「국방 정보화업무 훈령」 및 「국방정보화사업 제안서평가업무훈령」 참조
- 평가위원 사전접촉 확인, '블라인드 제안서' 제공 등을 통한 공정한 평가 환경 보장
 - * 평가위원과의 사전접촉·의견교류(SNS, E-메일 등), 편의 제공 행위 등 식별시 즉시 불이익 반영
- 동영상 녹화·보관 시스템 운영을 통한 투명한 평가절차와 평가위원 개인의 주관 개입 최소화 등 편향되지 않은 평가 시행

전문적이고 신뢰할 수 있는 제안서 평가체계 구축



'25년 주요 이슈사항 [4]

'26년 제안서 평가 강조[유의] 사항

- (사업관리지 면접) PM 면접 중요성 부각에 따른 평가 중점을 고려한 발표(브리핑)가 요구되며, 허위사실 언급으로 차후 불이익이 발생함에 따라 진실된 정보만으로 발표가 필요함.
* 평가 중점 : 사업이해도(목표, 타당성 등), 추진전략(위험요소 식별 등) 등
- (1) 업체 제안서) '24~'25년 평가결과 작성기준 미준수(감점), 체계기능·규격 미충족 등으로 불합격률 증가함. ['24년 대비, 불합격률 8% 증가 (20→28%)]
* 제안서 작성간 감점·불합격 주요 사례 보완을 통한 불필요한 감점 및 불합격 최소화
* 경미한 사항(사실관계 입증, 진위 확인 등)에 한하여 수요기관 요청 시 보완하여 평가 가능
- (2) 평가체계 개선) 육군의 요구규격의(체계성능 및 규격 등) 상위 규격 제안시 가점 부여 등 평가점수 비중 확대, 불필요한 평가요소(업체 식별표시, 불필요 표기 등)는 평가점수 비중 축소 등 개선 검토

기술력과 전문성이 우수한 업체 선정을 위한 평가 배점 조정 검토

① '24 ~ '25년 정보화사업 제안서 평가결과 비교 분석

총괄 현황

구 분	총 계		2단계 경쟁		협상에 의한 계약	
	평가	업체 (합격률)	평가	업체 (합격률)	평가	업체 (합격률)
'24년	6건	80% (20개 중 16)	4건	76% (17개 중 13)	2건	100% (3개)
'25년	11건	72% (40개 중 29개)	3건	75% (12개 중 9개)	8건	71% (28개 중 20개)

② [감점·불합격] 주요 사례

구 분	내 용
감 점	· (일반항목) 체계규격 미충족 · 제안서 분량 미준수(초과) · 작성기준(불필요 문구) 미준수 : 회사명 표기, 페이지 오류, 주요 직책 이름, 개인정보 등
불합격	· (필수항목) 체계기능 및 규격 미충족 · 필수 증빙자료 미제출 * 제조사 제품 요약서, 공인기관 제품인증서, 시험기관 인증서, 제조사 체계규격 충족 확인서 등

② 평가체계(평가표) 개선 검토

구 분	내 용
체계성능 및 규격 배점	체계규격 충족 시 부여한 기본점수 하향 조정 최대 가점 상향 조정
상대평가 방식 개선 감 점	제안된 성능 중 최고치를 기준으로 적용하여 환산 점수 부여 작성기준(서식, 형식 등) 관련 하향 조정

육군 정보화사업 추진 현황 [1/5]

총 22개 사업, 예산 약 1,300억원

24시간 365일 무중단 정보통신장비 운용을 위한 유지보수 사무업무 능력 향상을 위한 전산장비 도입

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ① 상용정보통신장비 통합유지보수 사업(연차) | ① 데스크톱(PC) 도입 사업 |
| ② 스마트부대 유지보수 사업 | ② 노트북 도입 사업 |
| ③ 육군 모바일 업무수행 체계 유지보수 사업 | ③ 모니터 도입 사업 |
| ④ 행정업무지원체계 유지보수 사업 | ④ 프린터 도입 사업 |
| ⑤ 고속상황전파체계 유지보수 사업 | |
| ⑥ ATCIS 유지보수 사업 ⑦ VoIP 유지보수 사업 | |

⑧ 군 스마트폰 활용체계 유지보수 사업

기반통신체계 등 보강을 위한 기반체계 보강

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① LAN 교체 사업 | |
| ② VoIP 교체 사업 | |
| ③ 케이블 교체공사 실시설계 사업 | |
| ④ 지능형 스마트부대 확대 구축 사업 | |
| ⑤ 전시체계 교체 사업 ⑥ 화상회의 교체 사업 | |

모바일 업무 확대 등을 위한 라이선스 구매 및 SW 기능개선

- | |
|-------------------------------------|
| ① ATCIS 개발 SW 기능개선 |
| ② 육군 모바일 업무수행 체계 라이선스(Knox, VPN) 구매 |
| ③ 재난안전통신망 단말기 전용 백신 라이선스 구매 |
| ④ 재난망 단말기 군 전용 앱 라이선스 구매 |



'26년 육군 정보화사업 추진 방향 [1/5]

1. 365일 24시간 중단없는 정보통신장비 운용 [유지보수 사업]

① 상용정보통신장비 통합유지보수	목적 육군의 상용정보통신장비의 중단없는 운용 대상 육군 전 지역 (1·2·3지역) 기간 '25~'27년 (장기계속) 계약 협상에 의한 계약 예산 1지역(57억원) 2지역(86억원) 3지역(130억원)	⑤ 고속상향전파체계 유지보수	목적 육군 고속상향전파체계 중단없는 안정적 운용 대상 육군, 해군, 공군 기간 '26년 계약 수의계약 예산 0.8억원
② 스마트부대 유지보수	목적 스마트부대 시범구축 사업 통합 유지보수 대상 1-1단계(9사단28여단) 1-2단계(1보급단) 기간 '26년 1-3단계(9사단) 계약 협상에 의한 계약 예산 15억원	⑥ ATCIS 유지보수	목적 ATCIS 장비의 중단없는 운용 대상 ATCIS 운용부대 기간 '26년 계약 전담기관 수의 계약 예산 59억원
③ 육군 모바일 업무수행 체계 유지보수	목적 육군 모바일업무수행을 위한 HW/SW/단말기 운용 여건 보장 대상 AMOS 단말기 (16,50대) 기간 '26년 계약 협상에 의한 계약 예산 3.5억원	⑦ VoIP 유지보수	목적 하자담보기간(3년) 이후 유지보수 반영으로 예방 및 긴급정비 실시 대상 5군단 등 66개부대 기간 '26. 7. 1 ~ '27. 6.30 계약 적격심사제 예산 24억원
④ 행정업무지원체계 유지보수	목적 시스템 성능개선 및 안정적 운영 보장 대상 부대행정업무체계 등 35개 체계 기간 '26년 계약 협상에 의한 계약 예산 8.3억원	⑧ 군 스마트폰 활용체계 유지보수	목적 육군 스마트폰 군 활용체계 중단없는 운용 대상 스마트폰 군 활용체계 단말기 기간 '26년 계약 수의계약 예산 2.0억원

'26년 육군 정보화사업 추진 방향 [2/5]

2. 기반통신체계 보강 및 스마트 부대 구축

① LAN 교체 (서지, UPS 포함)	목적 7년 이상 경과된 LAN 장비·시설 교체를 통해 안정적 지휘통신 운영 여건 보장 대상 1사단 등 119개 부대 기간 '26년 계약 2단계 경쟁(규격가격 동사에 의한 계약) 예산 65억원	④ 케이블 교체공사 실시설계	목적 15년 이상 경과된 주둔지 노후케이블 교체 대상 군수사(4개 부대), 60사단, 행정사(개부대) 기간 '26년 계약 적격심사제 예산 1.3억원
② VoIP 교체 (음성정보장치 포함)	목적 7년 이상 경과된 노후 VoIP 교환기 교체를 통해 안정적 지휘통신 운영 여건 보장 대상 3군단 등 10개 부대 기간 '26년 계약 2단계 경쟁(규격가격 동사에 의한 계약) 예산 110억원	⑤ 지능형 스마트부대 확대 구축	목적 '지휘관이 부대운영에 필요한 장비·시설·인원 등 모든 부대 현황과 작전·경계감시·부대방호 등 모든 작전상황을 지휘부에 실시간(On-line)으로 입체화·가시화 대상 2작전사, 수방사, 미사일사 기간 '26년 계약 협상에 의한 계약 예산 34억 원
③ 전시체계 교체	목적 지휘소 전시체계 교체사업 대상 육군 전부대 (위임사업 포함) 기간 '26년. 3~11월 계약 협상에 의한 계약 예산 육본통제(6.3억) 위임사업(45억)	⑥ 화상회의 교체	목적 지휘소 화상회의 코덱 및 카메라 교체 대상 육군 전부대 (위임사업 포함) 기간 '26년. 3~11월 계약 협상에 의한 계약 예산 육본통제(15억) 위임사업(52억)

